

# 諸岡第8雨水幹線築造工事（3） 工事概要

## 1. 工事目的

平成11年6月29日の集中豪雨で浸水被害が発生した地区で、浸水被害が重大かつ過去にも複数回浸水した地区を重点とし、雨水整備計画(雨水整備緊急計画 雨水整備Doプラン)に基づき、那珂(1)地区の浸水被害を軽減することを目的としている。  
 整備内容としては、5年確率降雨(5.2mm/h)から10年確率降雨(5.9mm/h)対応の雨水排水施設へと排水能力を強化するものである。

## 2. 工事内容


- ① 工事名 : 諸岡第8雨水幹線築造工事(3)
- ② 工期 : 平成27年4月1日～平成28年3月15日
- ③ 工事費 : ￥251,432,640-
- ④ 工事内容 : 泥濃式推進工(φ1580mm) L=225.3m  
 特殊人孔築造工(φ3000mm) 1箇所 5号人孔築造工 1箇所
- ⑤ 発注者 : 福岡市 道路下水道局 建設部 東部下水道課
- ⑥ 請負者 : 株式会社 海山組 代表取締役 海山 次貴
- ⑦ 特に顕著な事柄
  - ・多数の創意工夫(施工関係、安全衛生関係等)や災害避難訓練および福岡市消防局による救命講習を実施するなど、安全に対する意識が顕著であった。
  - ・地域一斉清掃活動に参加する等、日頃より水路清掃や除草作業を積極的に実施して、環境美化に努め、地元自治会と良好な関係を築いた。
  - ・インターンシップによる就業体験を積極的に取り入れ、実際の工事現場を体験させることで建設業のイメージアップや就業意識の促進に貢献した。
  - ・工事関係書類は、その都度、整理を行い出来形・品質とも特に良好であると共に、現場の整理整頓・安全対策も徹底されていた。

## 3. 位置図等

【位置図】



【平面図】

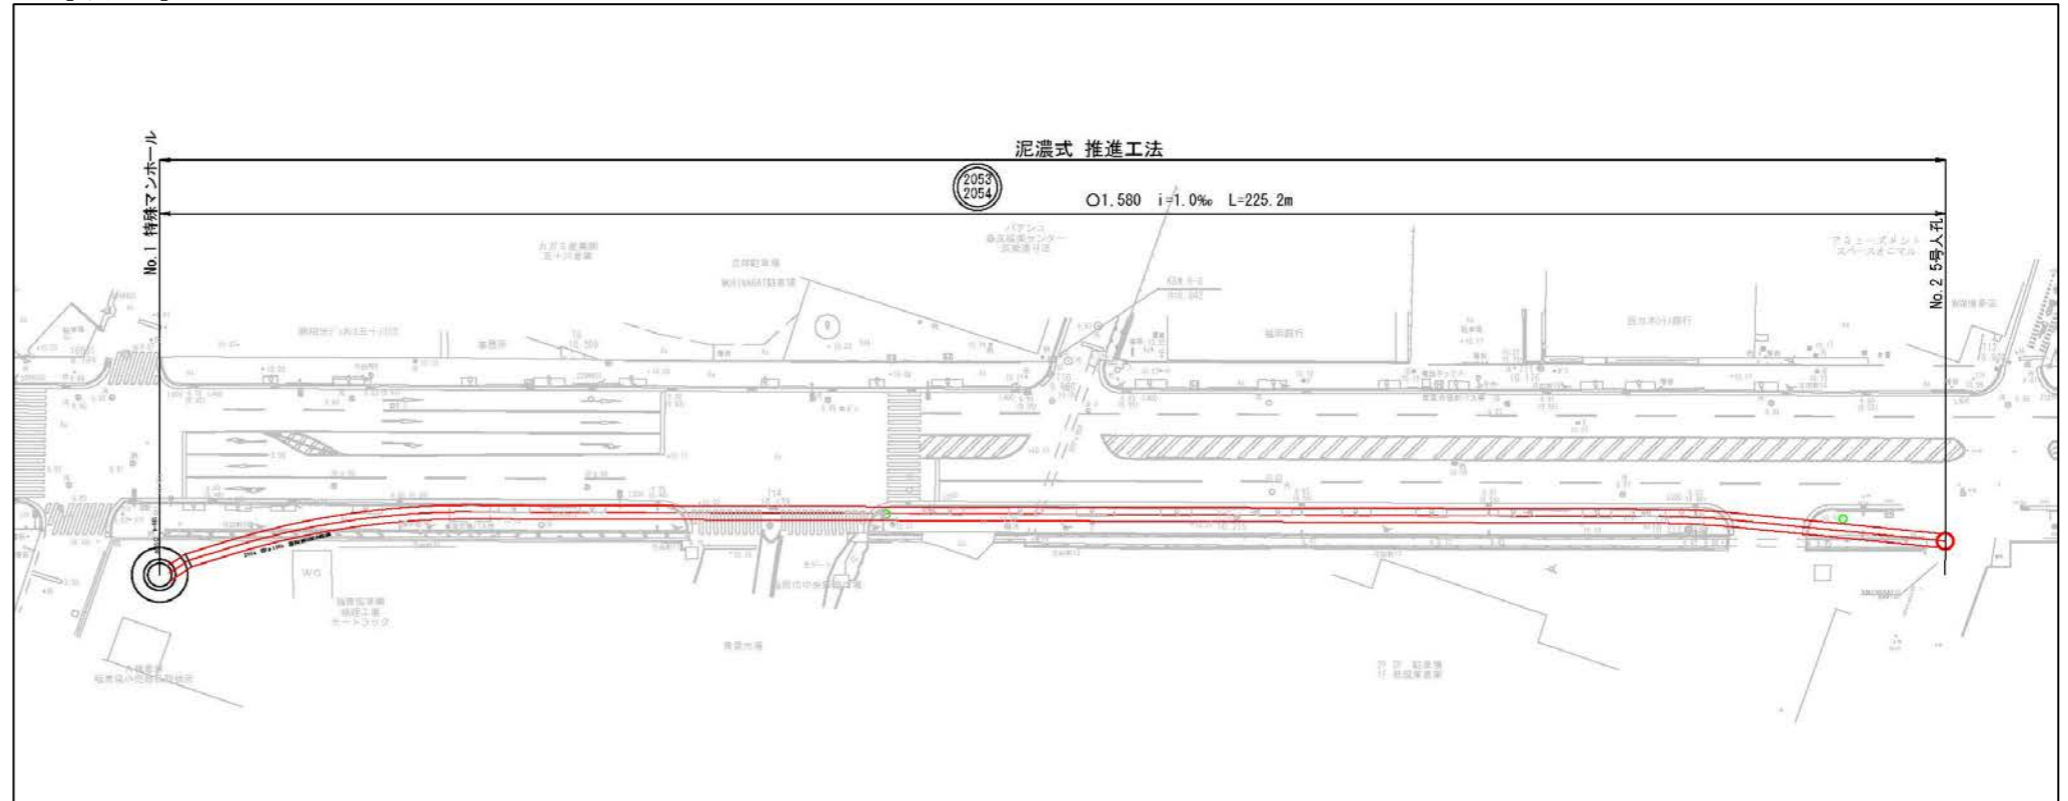

## 4. 工事写真

【着手前 No.1 発進立坑部】



【災害避難訓練の実施】



【消防局指導のもと救命講習の実施】



【地域一斉清掃への参加】



【インターンシップ実習】



【推進完了φ1580mm】

